
	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos	Antecessore
1	Concessionária	173,375 horas	18,883 dias?	16/05/23 08:00	09/06/23 16:04		
2	Porspecção	16,375 horas	1,25 dias?	16/05/23 08:00	17/05/23 10:00		
3	Estimativa Preliminar de Tamanho	1,5 horas	0,141 dias?	16/05/23 08:00	16/05/23 09:07		
4	Estimar Tamanho do Projeto	1 hora	0,125 dias?	16/05/23 08:00	16/05/23 09:00	Tamiris	
5	Revisar Estimativa de Tamanho do Projeto	0,5 horas	0,016 dias?	16/05/23 09:00	16/05/23 09:07	Bruno;Diego;Diogo;Thiago	4
6	Estimativa Preliminar de Cronograma e orçamento	14,875 horas	1,109 dias?	16/05/23 09:07	17/05/23 10:00		
7	Elaborar Cronograma e orçamento preliminares	6,875 horas	0,859 dias?	16/05/23 09:07	16/05/23 17:00	Diogo	5
8	Revisar Cronograma e orçamento preliminares	8 horas	0,25 dias?	17/05/23 08:00	17/05/23 10:00	Bruno;Diego;Tamiris;Thiago	7
9	Análise	28 horas	1,508 dias?	17/05/23 10:00	18/05/23 15:04		
10	Documento de Requisitos	28 horas	1,508 dias?	17/05/23 10:00	18/05/23 15:04		
11	Reunir-se com o Cliente	6 horas	0,375 dias?	17/05/23 10:00	17/05/23 14:00	Bruno;Thiago	8
12	Elaborar DRE	12 horas	0,75 dias?	17/05/23 14:00	18/05/23 11:00	Bruno;Thiago	11
13	Revisar DRE	8 horas	0,333 dias?	18/05/23 11:00	18/05/23 14:40	Diego;Diogo;Tamiris	12
14	Submeter DRE para aprovação da cliente	2 horas	0,05 dias?	18/05/23 14:40	18/05/23 15:04	Bruno;Diego;Diogo;Tamiris;Thiago	13
15	Implementação	119 horas	14,875 dias?	18/05/23 15:04	08/06/23 14:04		
16	Release 01	34 horas	4,25 dias?	18/05/23 15:04	25/05/23 08:04		
17	Implementação	32 horas	4 dias?	18/05/23 15:04	24/05/23 15:04		
18	Manter Funcionário	16 horas	2 dias?	18/05/23 15:04	22/05/23 15:04		
19	Implementar RFS01	4 horas	0,5 dias?	18/05/23 15:04	19/05/23 10:04		14
20	Implementar RFS02	4 horas	0,5 dias?	19/05/23 10:04	19/05/23 15:04		19
21	Implementar RFS03	4 horas	0,5 dias?	19/05/23 15:04	22/05/23 10:04		20
22	Implementar RFS04	4 horas	0,5 dias?	22/05/23 10:04	22/05/23 15:04		21
23	Manter Usuário	16 horas	2 dias?	22/05/23 15:04	24/05/23 15:04		
24	Implementar RFS05	4 horas	0,5 dias?	22/05/23 15:04	23/05/23 10:04		22
25	Implementar RFS06	4 horas	0,5 dias?	23/05/23 10:04	23/05/23 15:04		24
26	Implementar RFS07	4 horas	0,5 dias?	23/05/23 15:04	24/05/23 10:04		25
27	Implementar RFS08	4 horas	0,5 dias?	24/05/23 10:04	24/05/23 15:04		26
28	Teste	2 horas	0,25 dias?	24/05/23 15:04	25/05/23 08:04		
29	Testar Manter Funcionário	1 hora	0,125 dias?	24/05/23 15:04	24/05/23 16:04		27
30	Testar Manter Usuário	1 hora	0,125 dias?	24/05/23 16:04	25/05/23 08:04		29
31	Release 02	51 horas	6,375 dias?	25/05/23 08:04	02/06/23 11:04		
32	Implementação	49 horas	6,125 dias?	25/05/23 08:04	02/06/23 09:04		
33	Manter Cliente	20 horas	2,5 dias?	25/05/23 08:04	29/05/23 13:04		
34	Implementar RFS09	4 horas	0.5 dias?	25/05/23 08:04	25/05/23 13:04		30



	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos	Antecessores
35	Implementar RFS10	4 horas	0,5 dias?	25/05/23 13:04	26/05/23 08:04		34
36	Implementar RFS11	8 horas	1 dia?	26/05/23 08:04	29/05/23 08:04		35
37	Implementar RFS12	4 horas	0,5 dias?	29/05/23 08:04	29/05/23 13:04		36
38	Manter Veículo	29 horas	3,625 dias?	29/05/23 13:04	02/06/23 09:04		
39	Implementar RFS13	8 horas	1 dia?	29/05/23 13:04	30/05/23 13:04		37
40	Implementar RFS14	8 horas	1 dia?	30/05/23 13:04	31/05/23 13:04		39
41	Implementar RFS15	8 horas	1 dia?	31/05/23 13:04	01/06/23 13:04		40
42	Implementar RFS16	5 horas	0,625 dias?	01/06/23 13:04	02/06/23 09:04		41
43	Teste	2 horas	0,25 dias?	02/06/23 09:04	02/06/23 11:04		
44	Testar Manter Cliente	1 hora	0,125 dias?	02/06/23 09:04	02/06/23 10:04		42
45	Testar Manter Veículo	1 hora	0,125 dias?	02/06/23 10:04	02/06/23 11:04		44
46	Release 03	34 horas	4,25 dias?	02/06/23 11:04	08/06/23 14:04		
47	Implementação	32 horas	4 dias?	02/06/23 11:04	08/06/23 11:04		
48	Manter Vendas	16 horas	2 dias?	02/06/23 11:04	06/06/23 11:04		
49	Implementar RFS17	4 horas	0,5 dias?	02/06/23 11:04	02/06/23 16:04		45
50	Implementar RFS18	4 horas	0,5 dias?	02/06/23 16:04	05/06/23 11:04		49
51	Implementar RFS19	4 horas	0,5 dias?	05/06/23 11:04	05/06/23 16:04		50
52	Implementar RFS20	4 horas	0,5 dias?	05/06/23 16:04	06/06/23 11:04		51
53	Manter Estoque	16 horas	2 dias?	06/06/23 11:04	08/06/23 11:04		
54	Implementar RFS21	4 horas	0,5 dias?	06/06/23 11:04	06/06/23 16:04		52
55	Implementar RFS22	4 horas	0,5 dias?	06/06/23 16:04	07/06/23 11:04		54
56	Implementar RFS23	8 horas	1 dia?	07/06/23 11:04	08/06/23 11:04		55
57	Teste	2 horas	0,25 dias?	08/06/23 11:04	08/06/23 14:04		
58	Testar Manter Vendas	1 hora	0,125 dias?	08/06/23 11:04	08/06/23 13:04		56
59	Testar Manter Estoque	1 hora	0,125 dias?	08/06/23 13:04	08/06/23 14:04		58
60	Fase de Fechamento	10 horas	1,25 dias?	08/06/23 14:04	09/06/23 16:04		
61	Revisar Interfaces	4 horas	0,5 dias?	08/06/23 14:04	09/06/23 09:04		59
62	Revisar Funcionamento	4 horas	0,5 dias?	09/06/23 09:04	09/06/23 14:04		61
63	Apresentação ao Cliente	2 horas	0.25 dias?	09/06/23 14:04	09/06/23 16:04		62

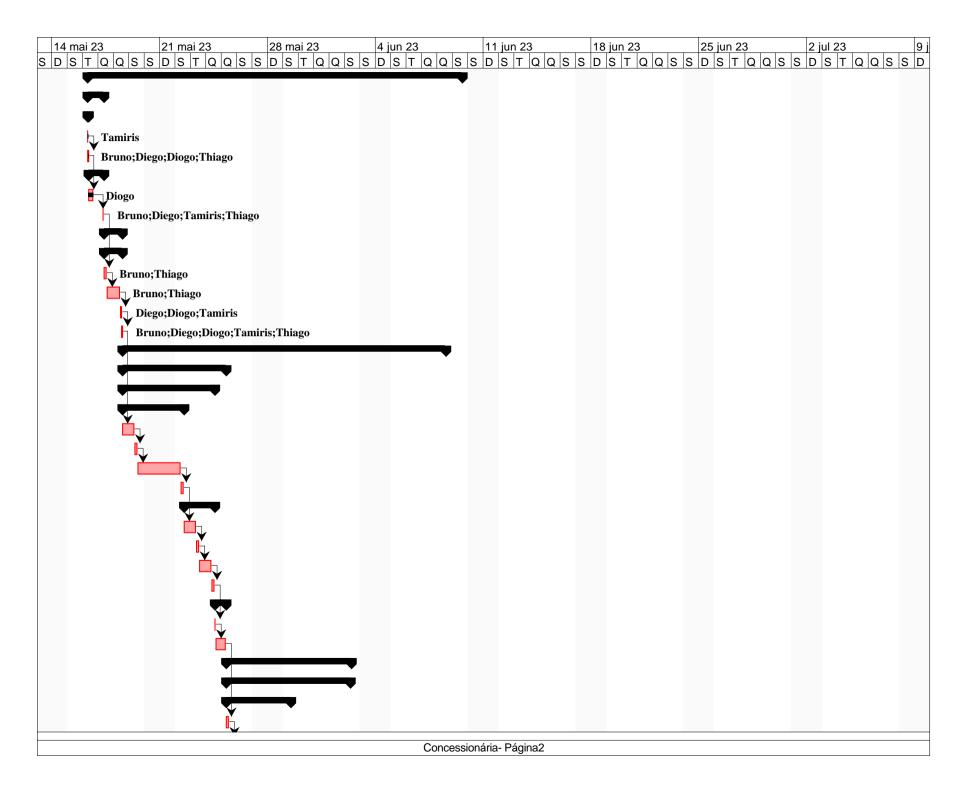
